

Portoviejo, 1 de febrero de 2021

EC.  
**GABRIEL GARCIA CASANOVA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE SAN PLACIDO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Por medio de la presente tengo a bien informarle que una vez finalizado los trabajos correspondientes al **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION, MEDIANTE LA COLOCACION DE POSTES ORNAMENTALES CON LAMPARAS LED, UBICADO EN LA CALLE 1 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO, A CONTINUACION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO CUCHUCHO FRENTE A LA SEDE DEL GADPR SAN PLACIDO, DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI"** , le hago entrega del libro de obra, anexos fotográficos, planilla única y factura para su respectiva revisión y pago.

Por la atención que le dé a la presente le quedo agradecido.

Atentamente,

  
ING. KARLA VILLEGAS ZAMBRANO

---

RUC:1309680161001  
Correo electrónico: karlitakvz@gmail.com  
Calle 12 de Octubre y Alberto Suarez  
0988823106  
Portoviejo - Manabí

## PLANILLA UNICA

<b>OBRA:</b>	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION, MEDIANTE LA COLOCACION DE POSTES ORNAMENTALES CON LAMPARAS LED, UBICADO EN LA CALLE 1 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO, A CONTINUACION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO CUCHUCHO FRENTE A LA SEDE DEL GADPR SAN PLACIDO, DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI		
<b>LUGAR:</b>	PORTOVIEJO	<b>VALOR CONTRATADO:</b>	\$6.416,06
<b>CONTRATISTA:</b>	ING. KARLA KATHERINE VILLEGAS ZAMBRANO	<b>PLAZO</b>	15 DIAS
<b>PLANILLA:</b>	UNICA	<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	14 DE ENERO DE 2021


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO		CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			
			CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIO	ACUMUL.	ESTE PERIODO	PERIODO ANTERIO	ACUMUL.
1	PROVISION E INSTALACION DE POSTE ORNAMENTAL DE 9 METROS DE ALTURA DOBLE BRAZO A 9 A 5 METROS	U	4,00	\$ 834,09	\$ 3.336,36	4,00	0,00	4,00	\$ 3.336,36	\$ -	\$ 3.336,36
2	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DE 100W	U	4,00	\$ 301,38	\$ 1.205,52	4,00	0,00	4,00	\$ 1.205,52	\$ -	\$ 1.205,52
3	PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DE 150W	U	4,00	\$ 361,38	\$ 1.445,52	4,00	0,00	4,00	\$ 1.445,52	\$ -	\$ 1.445,52
4	ROTURAS Y REPOSICION DE ACERAS	M2	7,20	\$ 37,72	\$ 271,58	7,20	0,00	7,20	\$ 271,58	\$ -	\$ 271,58
5	PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOR CONCENTRICO 3X14 AWG	M	132,00	\$ 1,19	\$ 157,08	132,00	0,00	132,00	\$ 157,08	\$ -	\$ 157,08
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 6.416,06</b>						
			<b>TOTAL CONTRATADO</b>		<b>\$ 7.185,99</b>						
			<b>IVA 12%</b>		<b>\$ 769,93</b>						
			<b>TOTAL A PLANILLAR</b>		<b>\$ 6.416,06</b>						
			<b>IVA 12%</b>		<b>\$ 769,93</b>						
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.185,99</b>						

A	PLANILLA UNICA	6.416,06
B	12% DEL IVA	769,93
C	TOTAL	7.185,99

*Karla Villegas Z.*

ING. KARLA KATHERINE VILLEGAS ZAMBRANO  
CONTRATISTA

# ANEXOS FOTOGRAFICOS

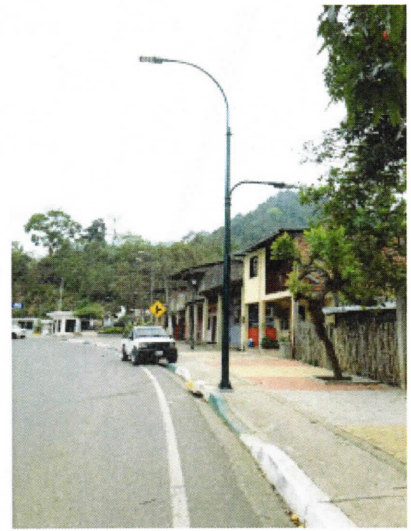

# ANEXOS FOTOGRAFICOS



# ANEXOS FOTOGRAFICOS



# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

OBRA:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION, MEDIANTE LA COLOCACION DE POSTES ORNAMENTALES CON LAMPARAS LED, UBICADO EN LA CALLE 1 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO, A CONTINUACION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO CUCHUCHO FRENTE A LA SEDE DEL GADPR SAN PLACIDO, DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI		
UBICACION:	SAN PLACIDO	FECHA:	14 de 25 de noviembre 2021
CONTRATISTA:	ING. KARLA VILLEGAS ZAMBRANO		

## 1.- TRABAJOS REALIZADOS:

ELABORACION DE POSTES ORNAMENTALES DE 9 METROS DE ALTURA  
ELABORACION DE BASES PARA POSTES ORNAMENTALES  
INSTALACION DE BASES PARA POSTES ORNAMENTALES  
ROTURA DE ACERAS  
REPOSICION DE ACERAS  
INSTALACION DE CONDUCTOR CONCENTRADO


## 2.- EQUIPO Y MATERIAL A UTILIZAR:

HERRAMIENTAS MENORES.	TUBERIA 6" CEDULA 40
SOLDADURA MIG	TUBERIA DE 2 1/2" x 3mm.
PLASTIA	PLANCHA DE 10mm
SOLDADURA ELECTRICA	PLANCHA DE 8mm.
TALADRO DE PEDESTAL	TONDO EPOXICO
CORTADORA DE HIERRO	DIJENTE, LACA, PINTURA POLIURETANO
ABRE HOYOS	BRILLO.
PALA PLU ORNETA	REMOVEDOR, DESENCORASANTE.
	CEMENTO, ARENA, RUPID
	VAPILLAS DE 12mm y 8mm

## 3.- PERSONAL:

2 SOLDADORES.  
2 AYUDANTES.  
1 PINTOR  
2 MAESTRO ALBAÑIL

## 4.- OBSERVACIONES:



ING. KARLA VILLEGAS ZAMBRANO  
CONTRATISTA

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

OBRA:	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACION, MEDIANTE LA COLOCACION DE POSTES ORNAMENTALES CON LAMPARAS LED, UBICADO EN LA CALLE 1 DE DICIEMBRE MARGEN DERECHO, A CONTINUACION DEL PUENTE SOBRE EL ESTERO CUCHUCHO FRENTE A LA SEDE DEL GADPR SAN PLACIDO, DE LA PARROQUIA SAN PLACIDO, CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI		
UBICACION:	SAN PLACIDO	FECHA:	25 de 28 enero 2021
CONTRATISTA:	ING. KARLA VILLEGAS ZAMBRANO		

## 1.- TRABAJOS REALIZADOS:

INSTALACION DE POSTES ORNAMENTALES DE 9MTS DOBLE BRAZO  
INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DE 100W  
INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED DE 150W

## 2.- EQUIPO Y MATERIAL A UTILIZAR:

HERRAMIENTAS MENORES  
CARRO CAMIOTA  
LUMINARIA VIAL LED 100W  
LUMINARIA VIAL LED 150W

## 3.- PERSONAL:

2 TECNICOS ELECTRICISTAS  
2 AYUDANTES  
1 OPERADOR DE CARRO CAMIOTA

## 4.- OBSERVACIONES:



ING. KARLA VILLEGAS ZAMBRANO  
CONTRATISTA
